



FASE 1

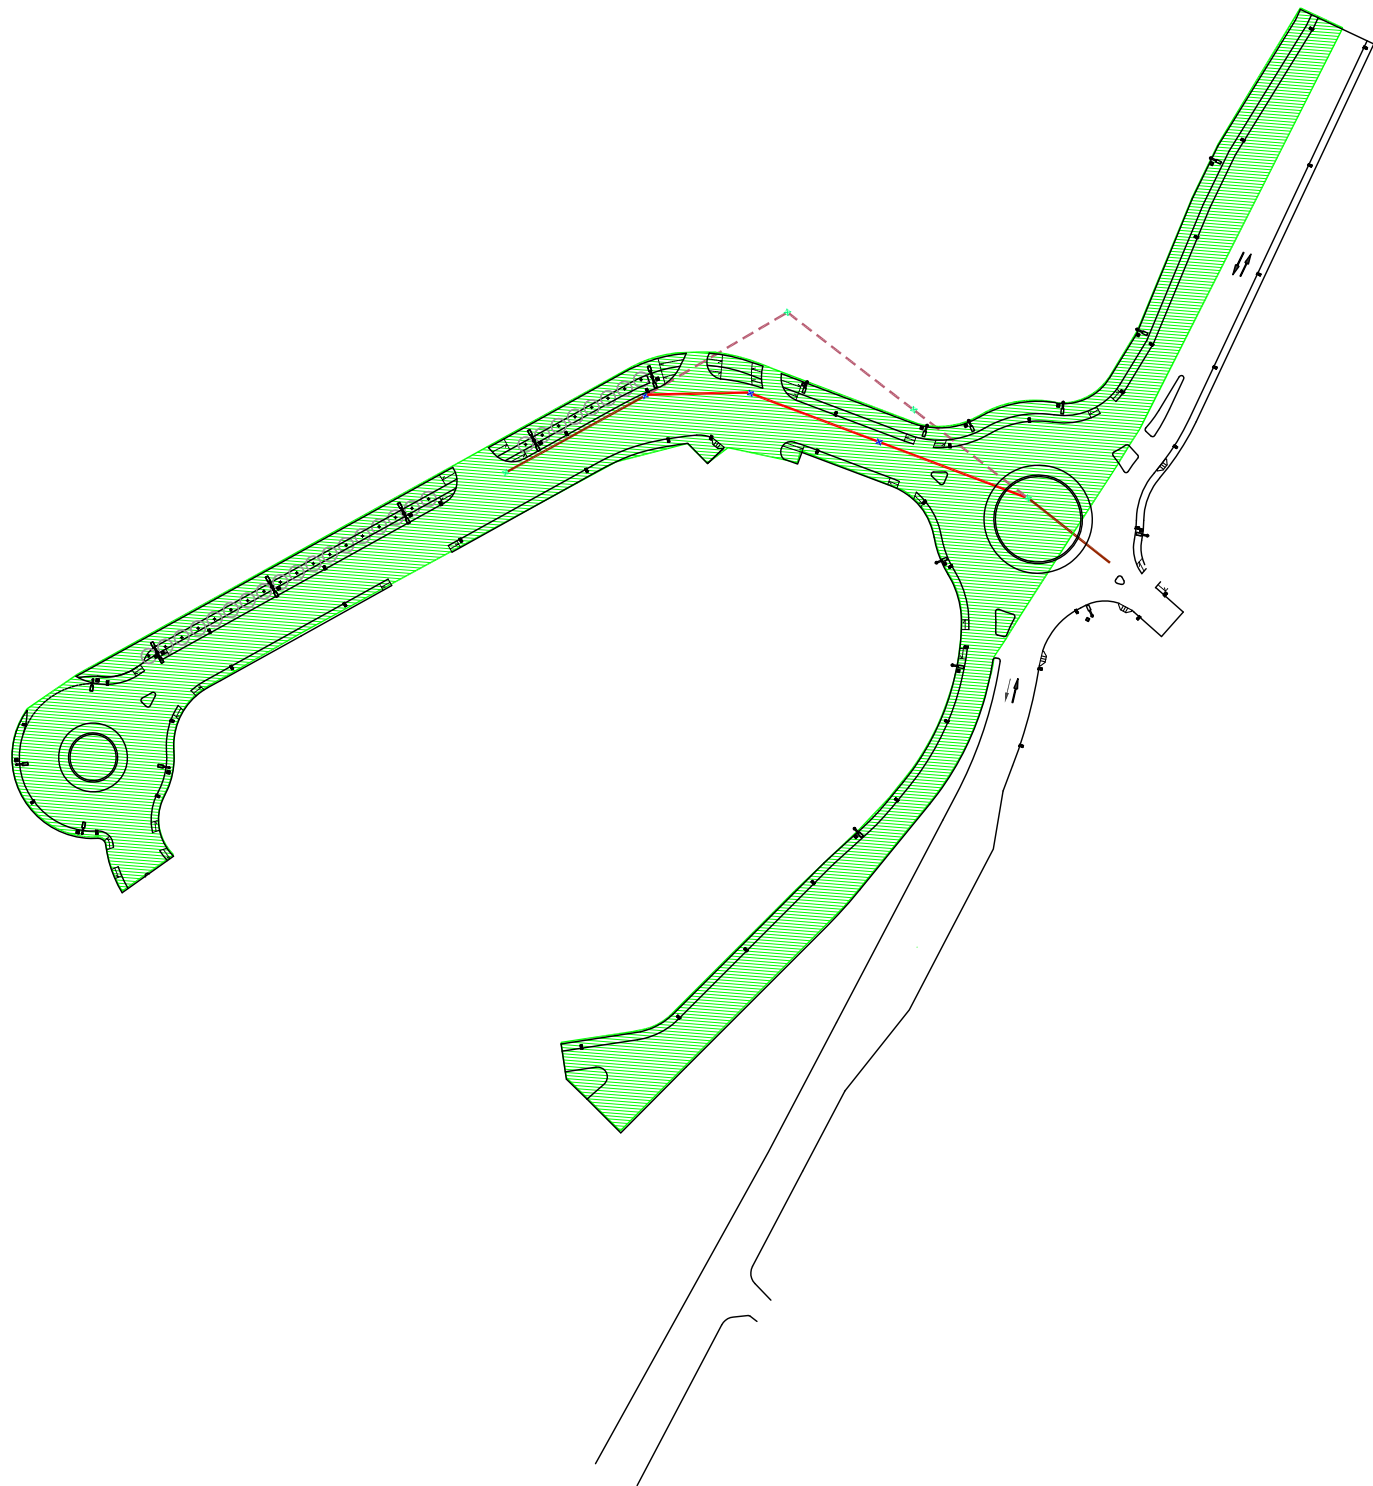

FASE 2

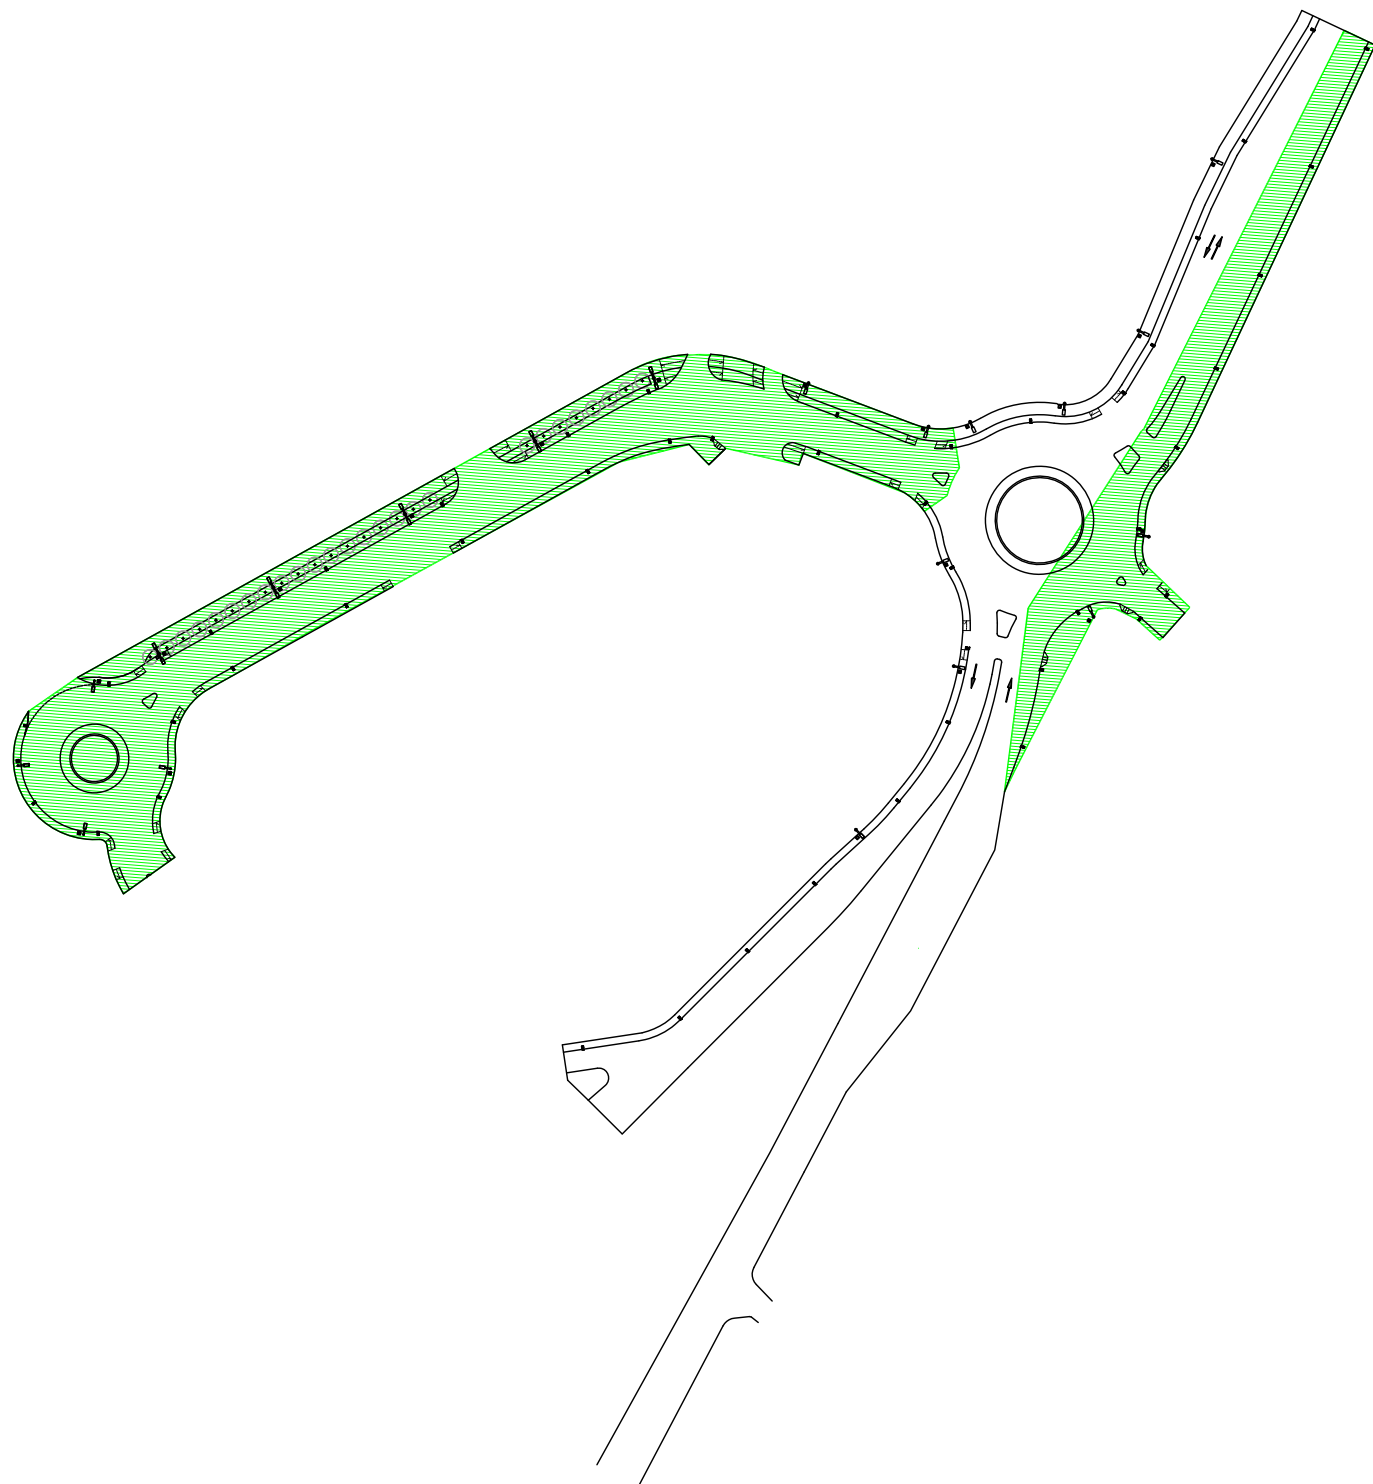

FASE 1 (105 giorni):

- Accantieramento
- Modifica provvisoria viabilità SS33 con deviazione traffico su corsia nord
- Deviazione fognatura
- Carreggiata SUD SS33 (sottoservizi, pozzi perdenfi, cassonetto)

FASE 2 (45 giorni):

- Modifica provvisoria viabilità SS33 con deviazione traffico su corsia sud
- Carreggiata Nord SS33 (sottoservizi, cassonetto)

FASE 3 (30 giorni):

- Asfalto e segnaletica provvisoria
- Apertura provvisoria SS33 e viabilità SUD
- Sistemazioni a verde
- Collaudi
- Apertura definitiva viabilità

FASE 4 (60 giorni):

- Redilizzazione tratto SUD

LEGENDA

AREA DI CANTIERE

LINEA FOGNATURA DA DISMETTERE

NUOVA LINEA FOGNATURA IN PROGETTO

comune di pogliano milanese

zona C/T1

mobilit r viale lombardia, 5 milano

il progettista

la propriet 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DELLE
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA


Fasi di cantiere e
cronoprogramma

scala ----


tavola 28

Rev. Aprile 2015
per validazione
Dicembre 2014

FASE 3

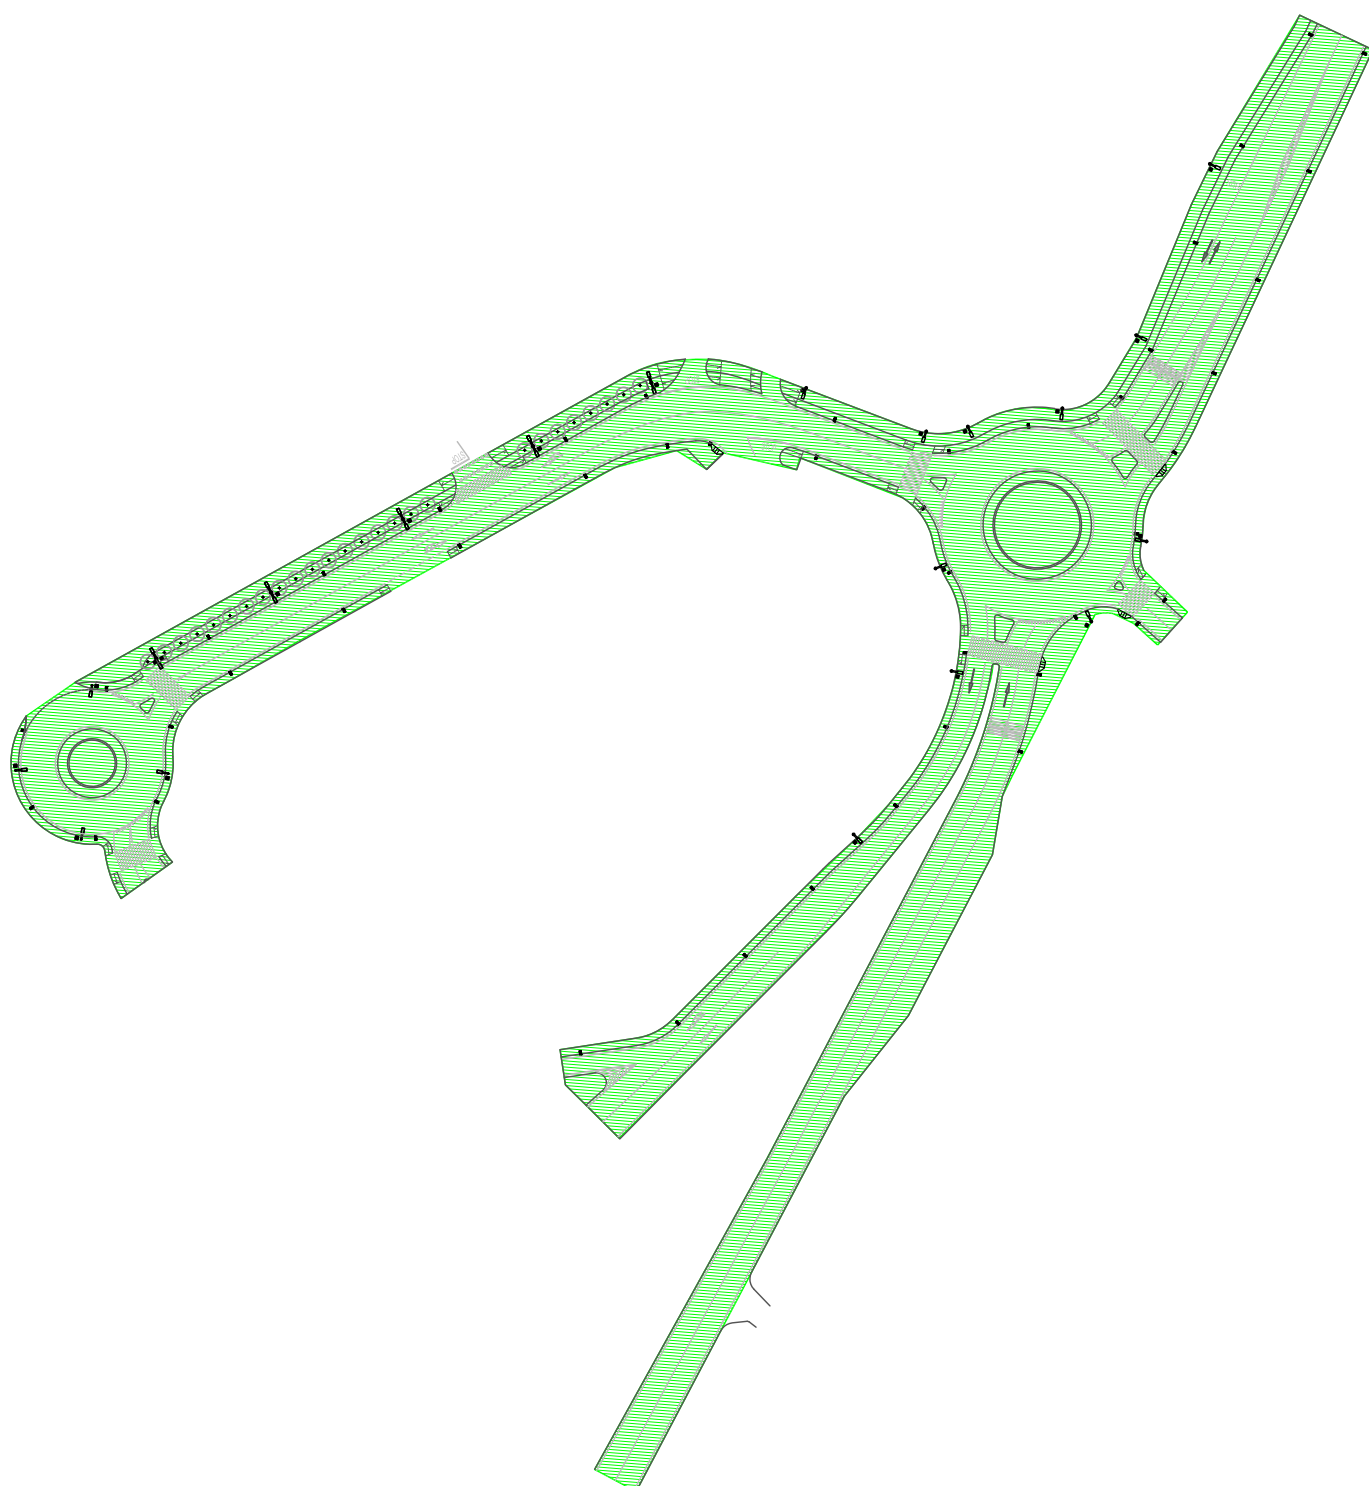

FASE 4

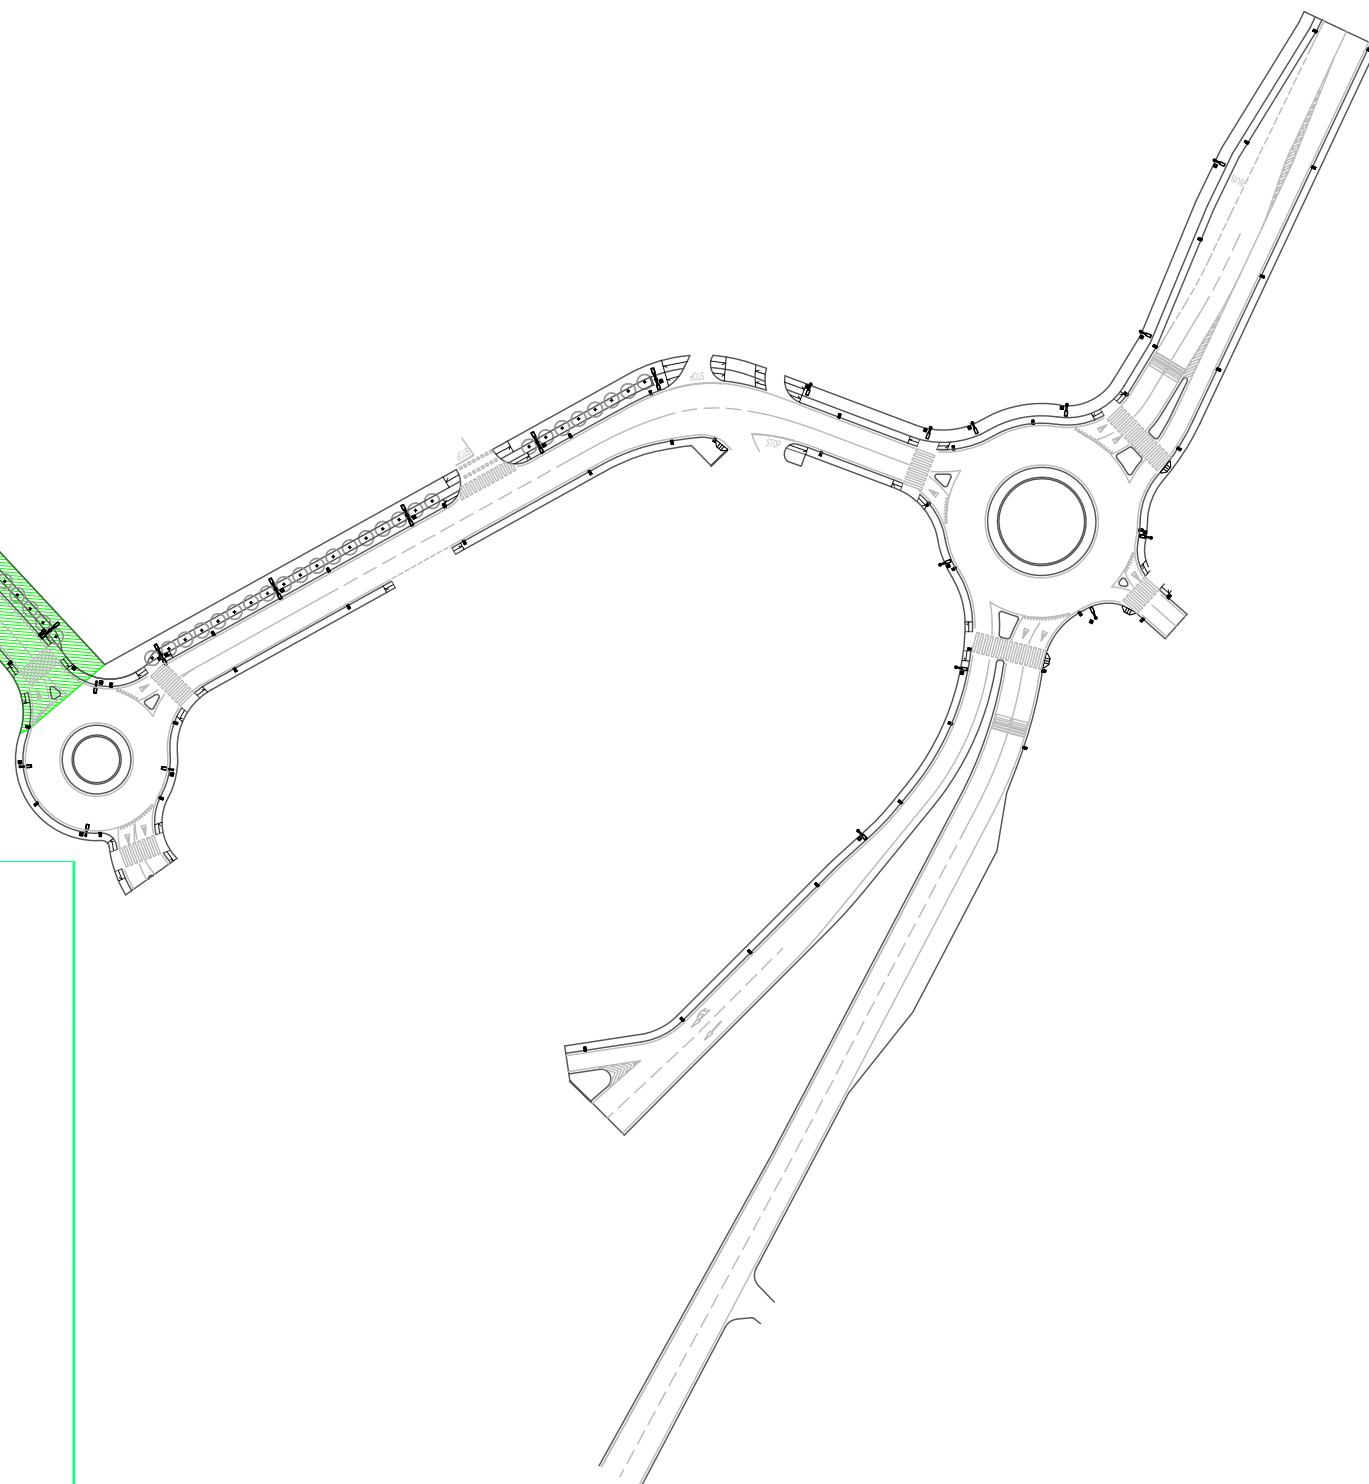

CRONOPROGRAMMA													
ATTIVIT�	DESCRIZIONE	GG	FASE 1 - 105 GG				FASE 2 - 45 GG		FASE 3 - 30 GG		FASE 4 - 60 GG		
			I MESE	II MESE	III MESE	IV MESE	V MESE	VI MESE	VII MESE	VIII MESE	IX MESE	X MESE	
1	ACCANTIERAMENTO	300	15/05	15/05	15/05	15/05	15/05	15/05	15/05	15/05	15/05	15/05	
2	DEVIATIONE FOGNATURA	60											
3	MODIFICA VIABILIT� SS33 - Modifica su corsia nord tratto SUD - realizzo pozzi perdenfi e cassonetto modifica provvisoria viabilit� SS33 - deviazione su corsia nord tratto NORD - sottoservizi, pozzi perdenfi e cassonetto	120											
4	COLLAUDI	30											
5	TRATTO SUD	60											

statale 33 srl viale delle rimembranze, 6 lainate
piano integrato di intervento
